


BIJLAGE 5.22 ZEEFKROMME t.b.v. alle materialen voor dambouw Europoort.

GEWICHTSPROCENTAGE DAT DE ZEEF PASSEERT. %

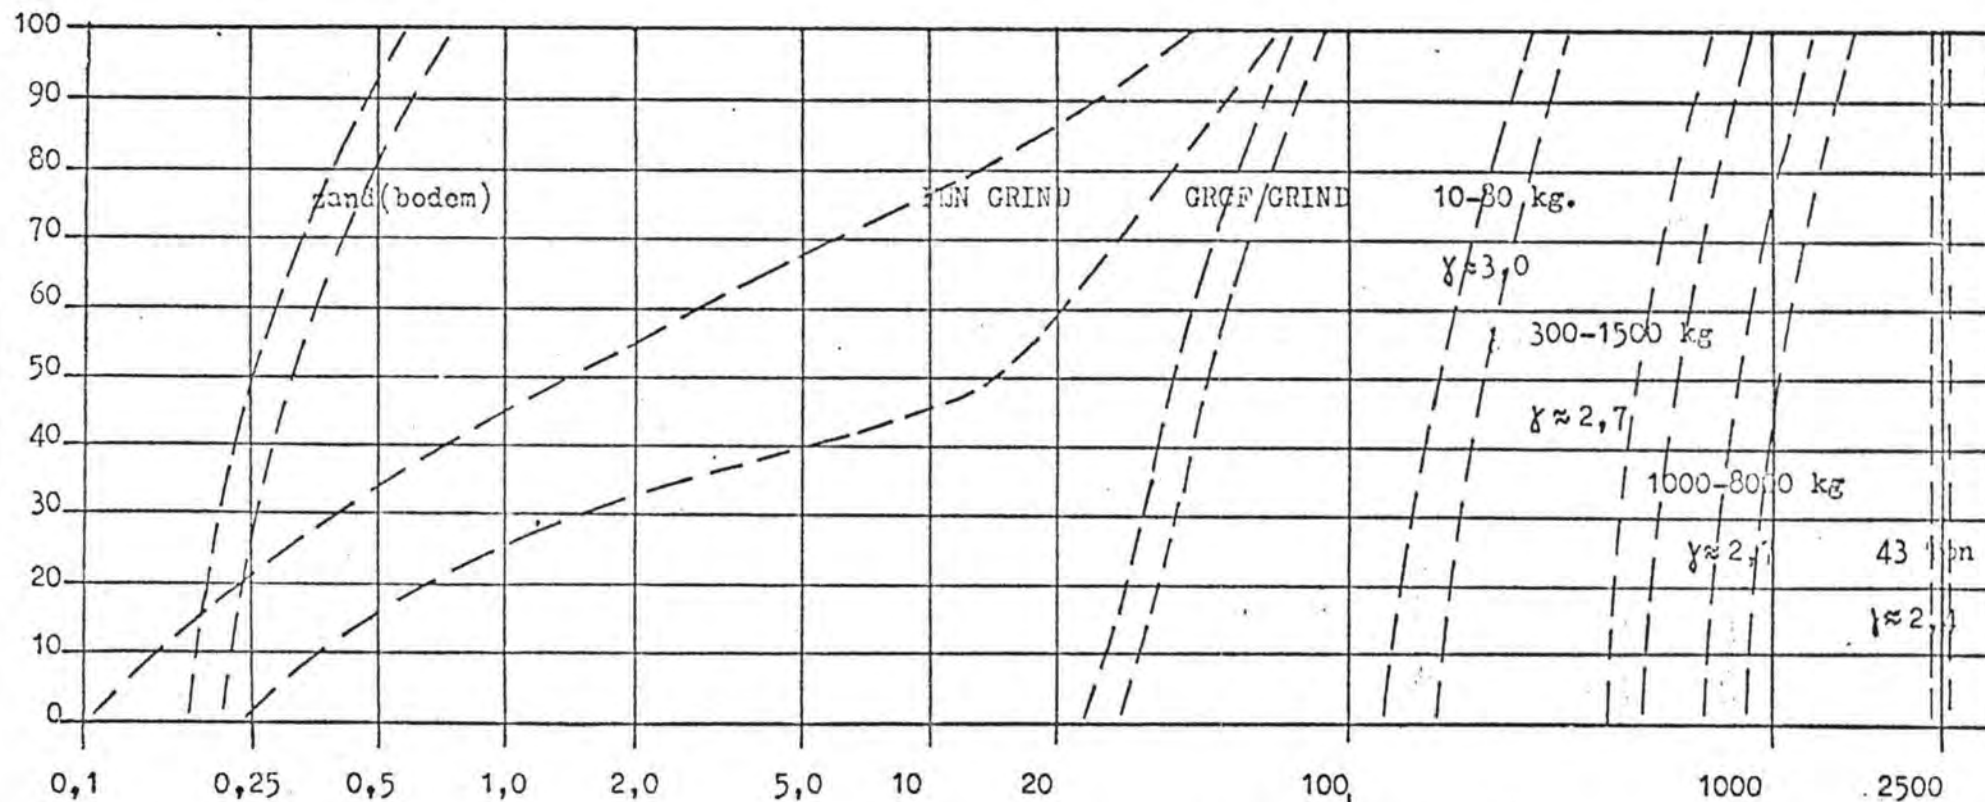

DIAMETER

KUBUS ZIJDE (RIBBE)

DIAMETER / RIBBE IN MILLIMETERS

WGK-D-76030
761019

BIJLAGE 1

Behoort bij schrijven


d.d. 76.03.09 No. 945

RIJKSWEGENBOUWLABORATORIUM
DELFT

KORRELGROOTTEVERDELING ZANDMONSTERS (zie bijlage 2)

	Hammen I	Hammen II	Schaar I (buis)	Schaar I (pot)
Gesommeerde zeefrest in gewichtsprocenten op zeef NEN 2560 - 2 mm	0	0	2 (schelpen)	0
- 1 mm	0	0	2 (schelpen)	0
- 500 μ m	0	0	3 (schelpen)	1
- 250 μ m	28	28	51	55
- 125 μ m	99	99	97	99
- 63 μ m	100	100	100	100

—— Hammen I en 2
---- Schaar I
-.-.- Schaar I

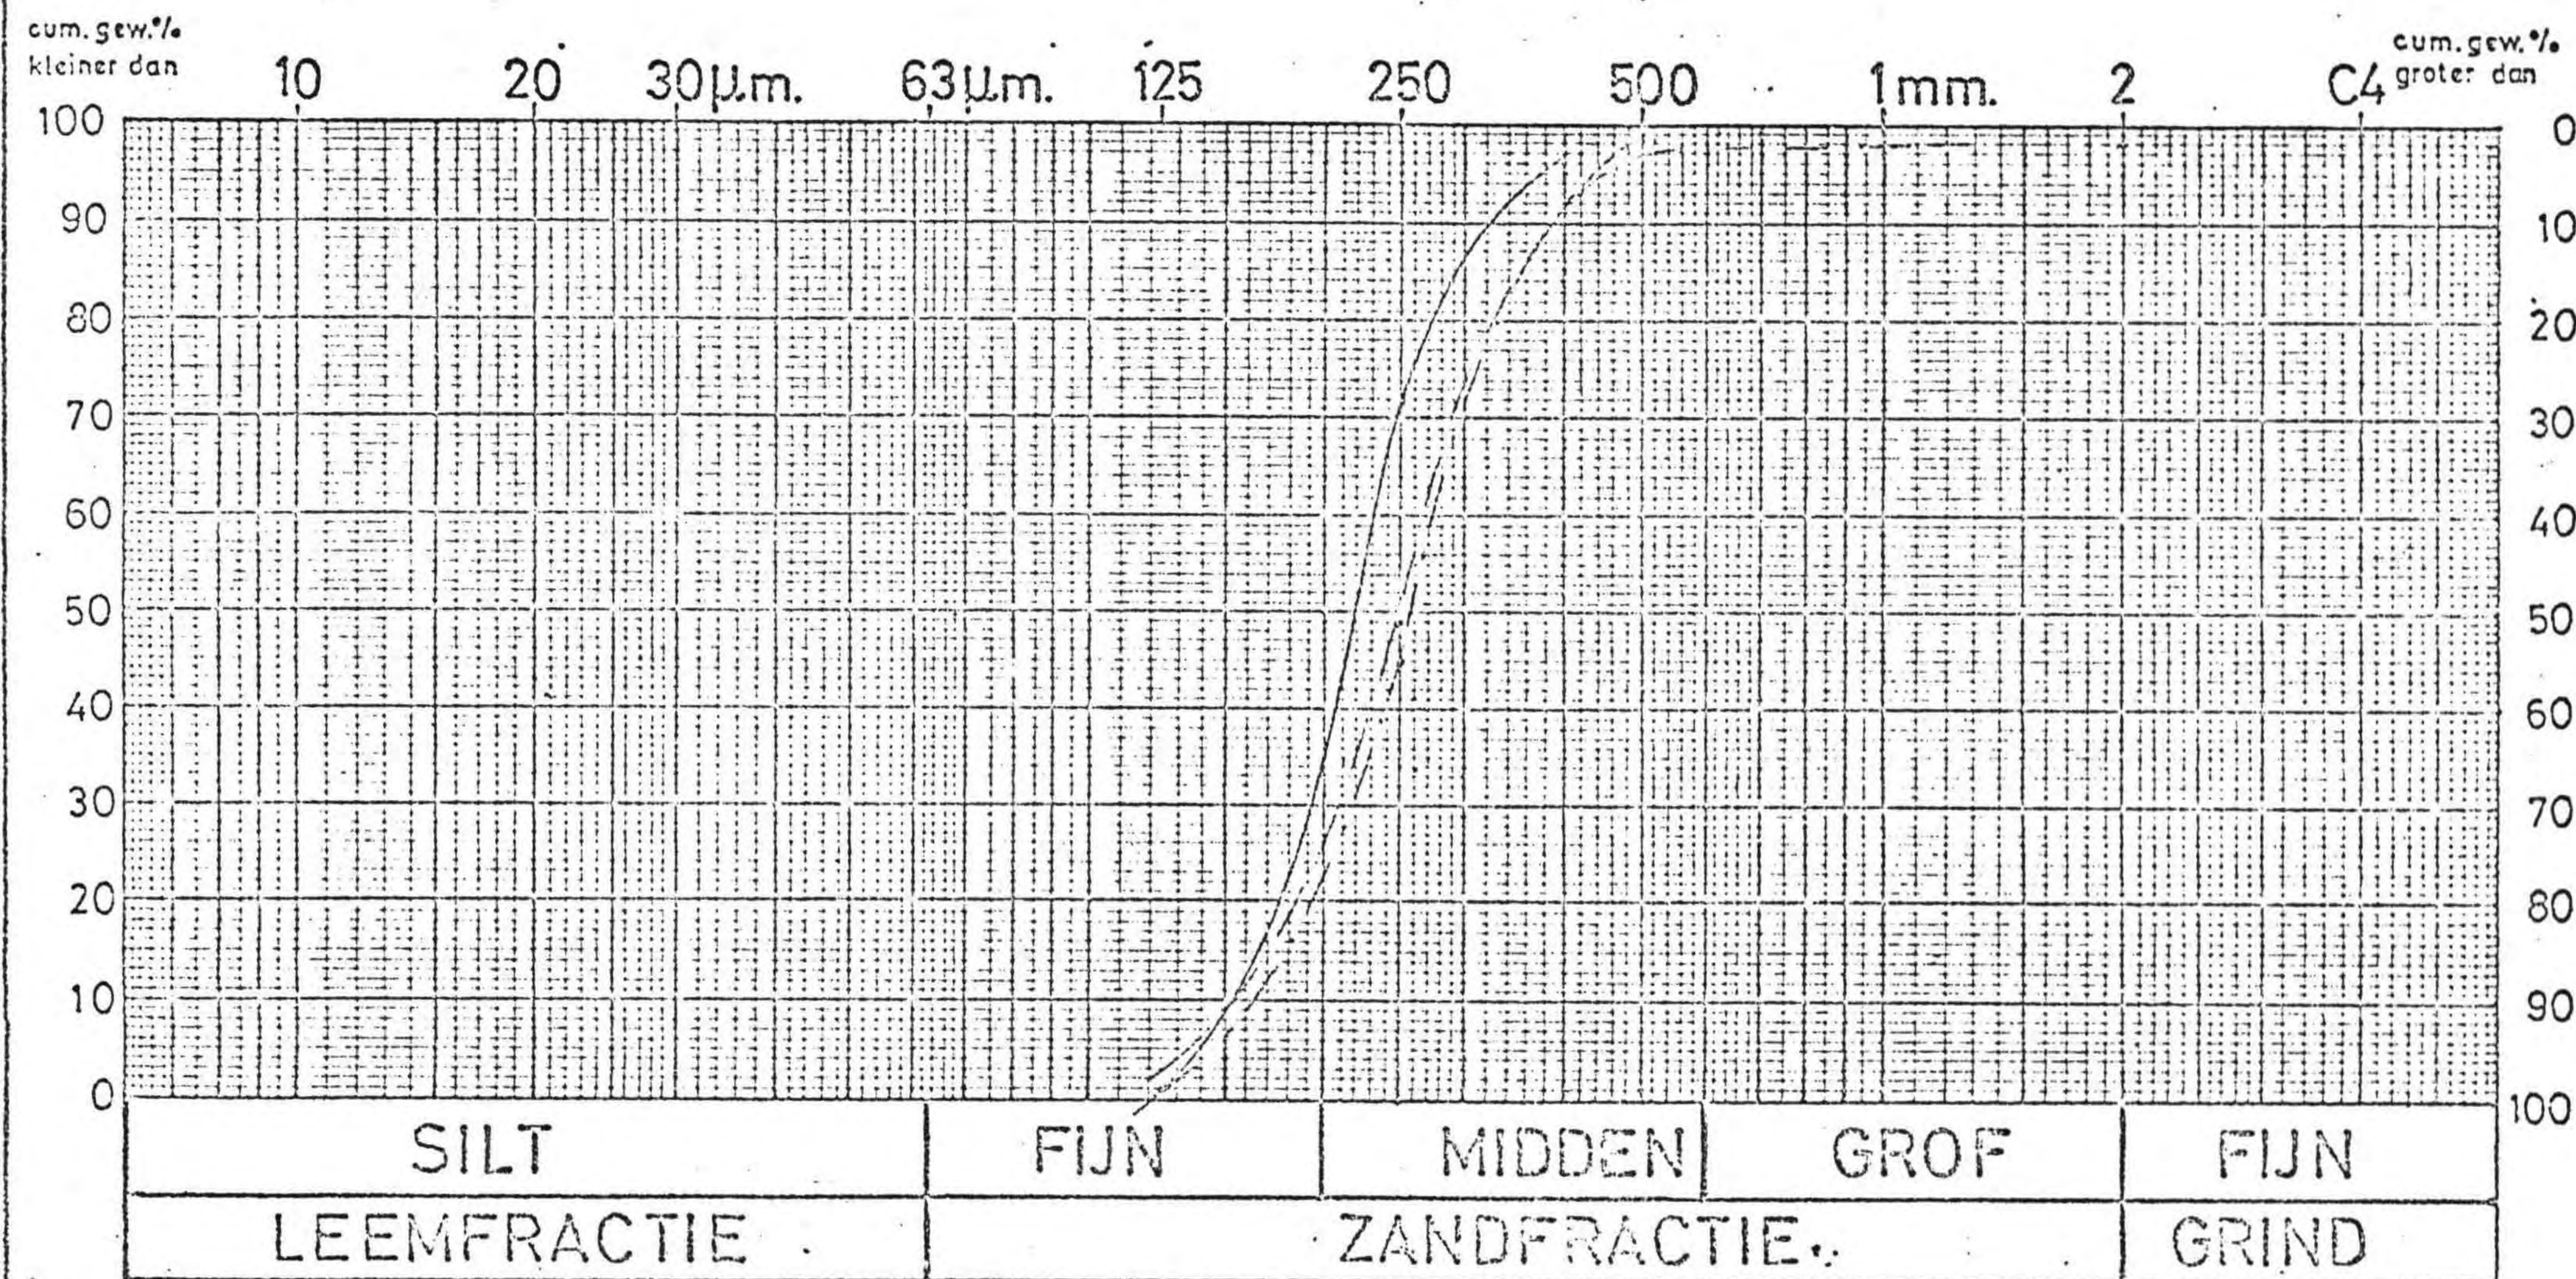

KORRELGROOTTEVERDELING FOSFORSLAKKEN (zie bijlage 4)

	Lith I 0-5 uitge- zeefd	Lith II	Lith III uitge- wassen	Bodem O'schelde (kist)	Perskade
Gesommeerde zeefrest in gewichtsprocenten op zeef RWL*					
- 250x250	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0
- 180x180	4,1	2,1	3,0	0,0	0,0
- 125x125	10,4	4,0	3,6	0,7	0,0
- 90x 90	21,3	7,6	15,9	4,9	0,0
zeef NEN 2560 - C63	30,5	15,4	22,0	13,2	5,1
- C45	43,1	26,1	35,7	26,6	11,7
- C31,5	57,0	36,5	53,2	40,5	20,8
- C22,4	69,3	47,1	70,5	48,5	28,9
- C16	79,0	60,4	84,0	59,3	42,5
- C 8	88,7	79,9	94,9	74,2	60,6
- C 4	91,3	89,7	97,1	83,0	71,0
- 2 mm	92,5	93,2	97,8	87,6	74,7
- 1 mm				90,2	76,7
- 500 µm				92,5	77,4
- 250 µm				94,5	79,7
- 125 µm				98,6	93,3
- 63 µm				99,2	98,1

*door RWL geïmproviseerde zeven


KORRELGROOTTEVERDELING VAN DE ZANDFRAKTIE IN DE SLAKKEN (zie bijlage 5)

	Bodem O'schelde	Perskade
Gesommeerde zeefrest in gewichtsprocenten op zeef NEN 2560 - 2 mm	0,0	0,0
- 1 mm	21,1	7,9
- 500 µm	39,7	10,8
- 250 µm	55,7	19,7
- 125 µm	87,1	73,6
- 63 µm	93,4	92,4

% cum. door zeef

% cum. op zeef

———— Lith I
 - - - - - " II
 - - - - - Kist III
 - - - - - Perskade
 1,4 2,8 5,6 11,2 22,4 45 90 180

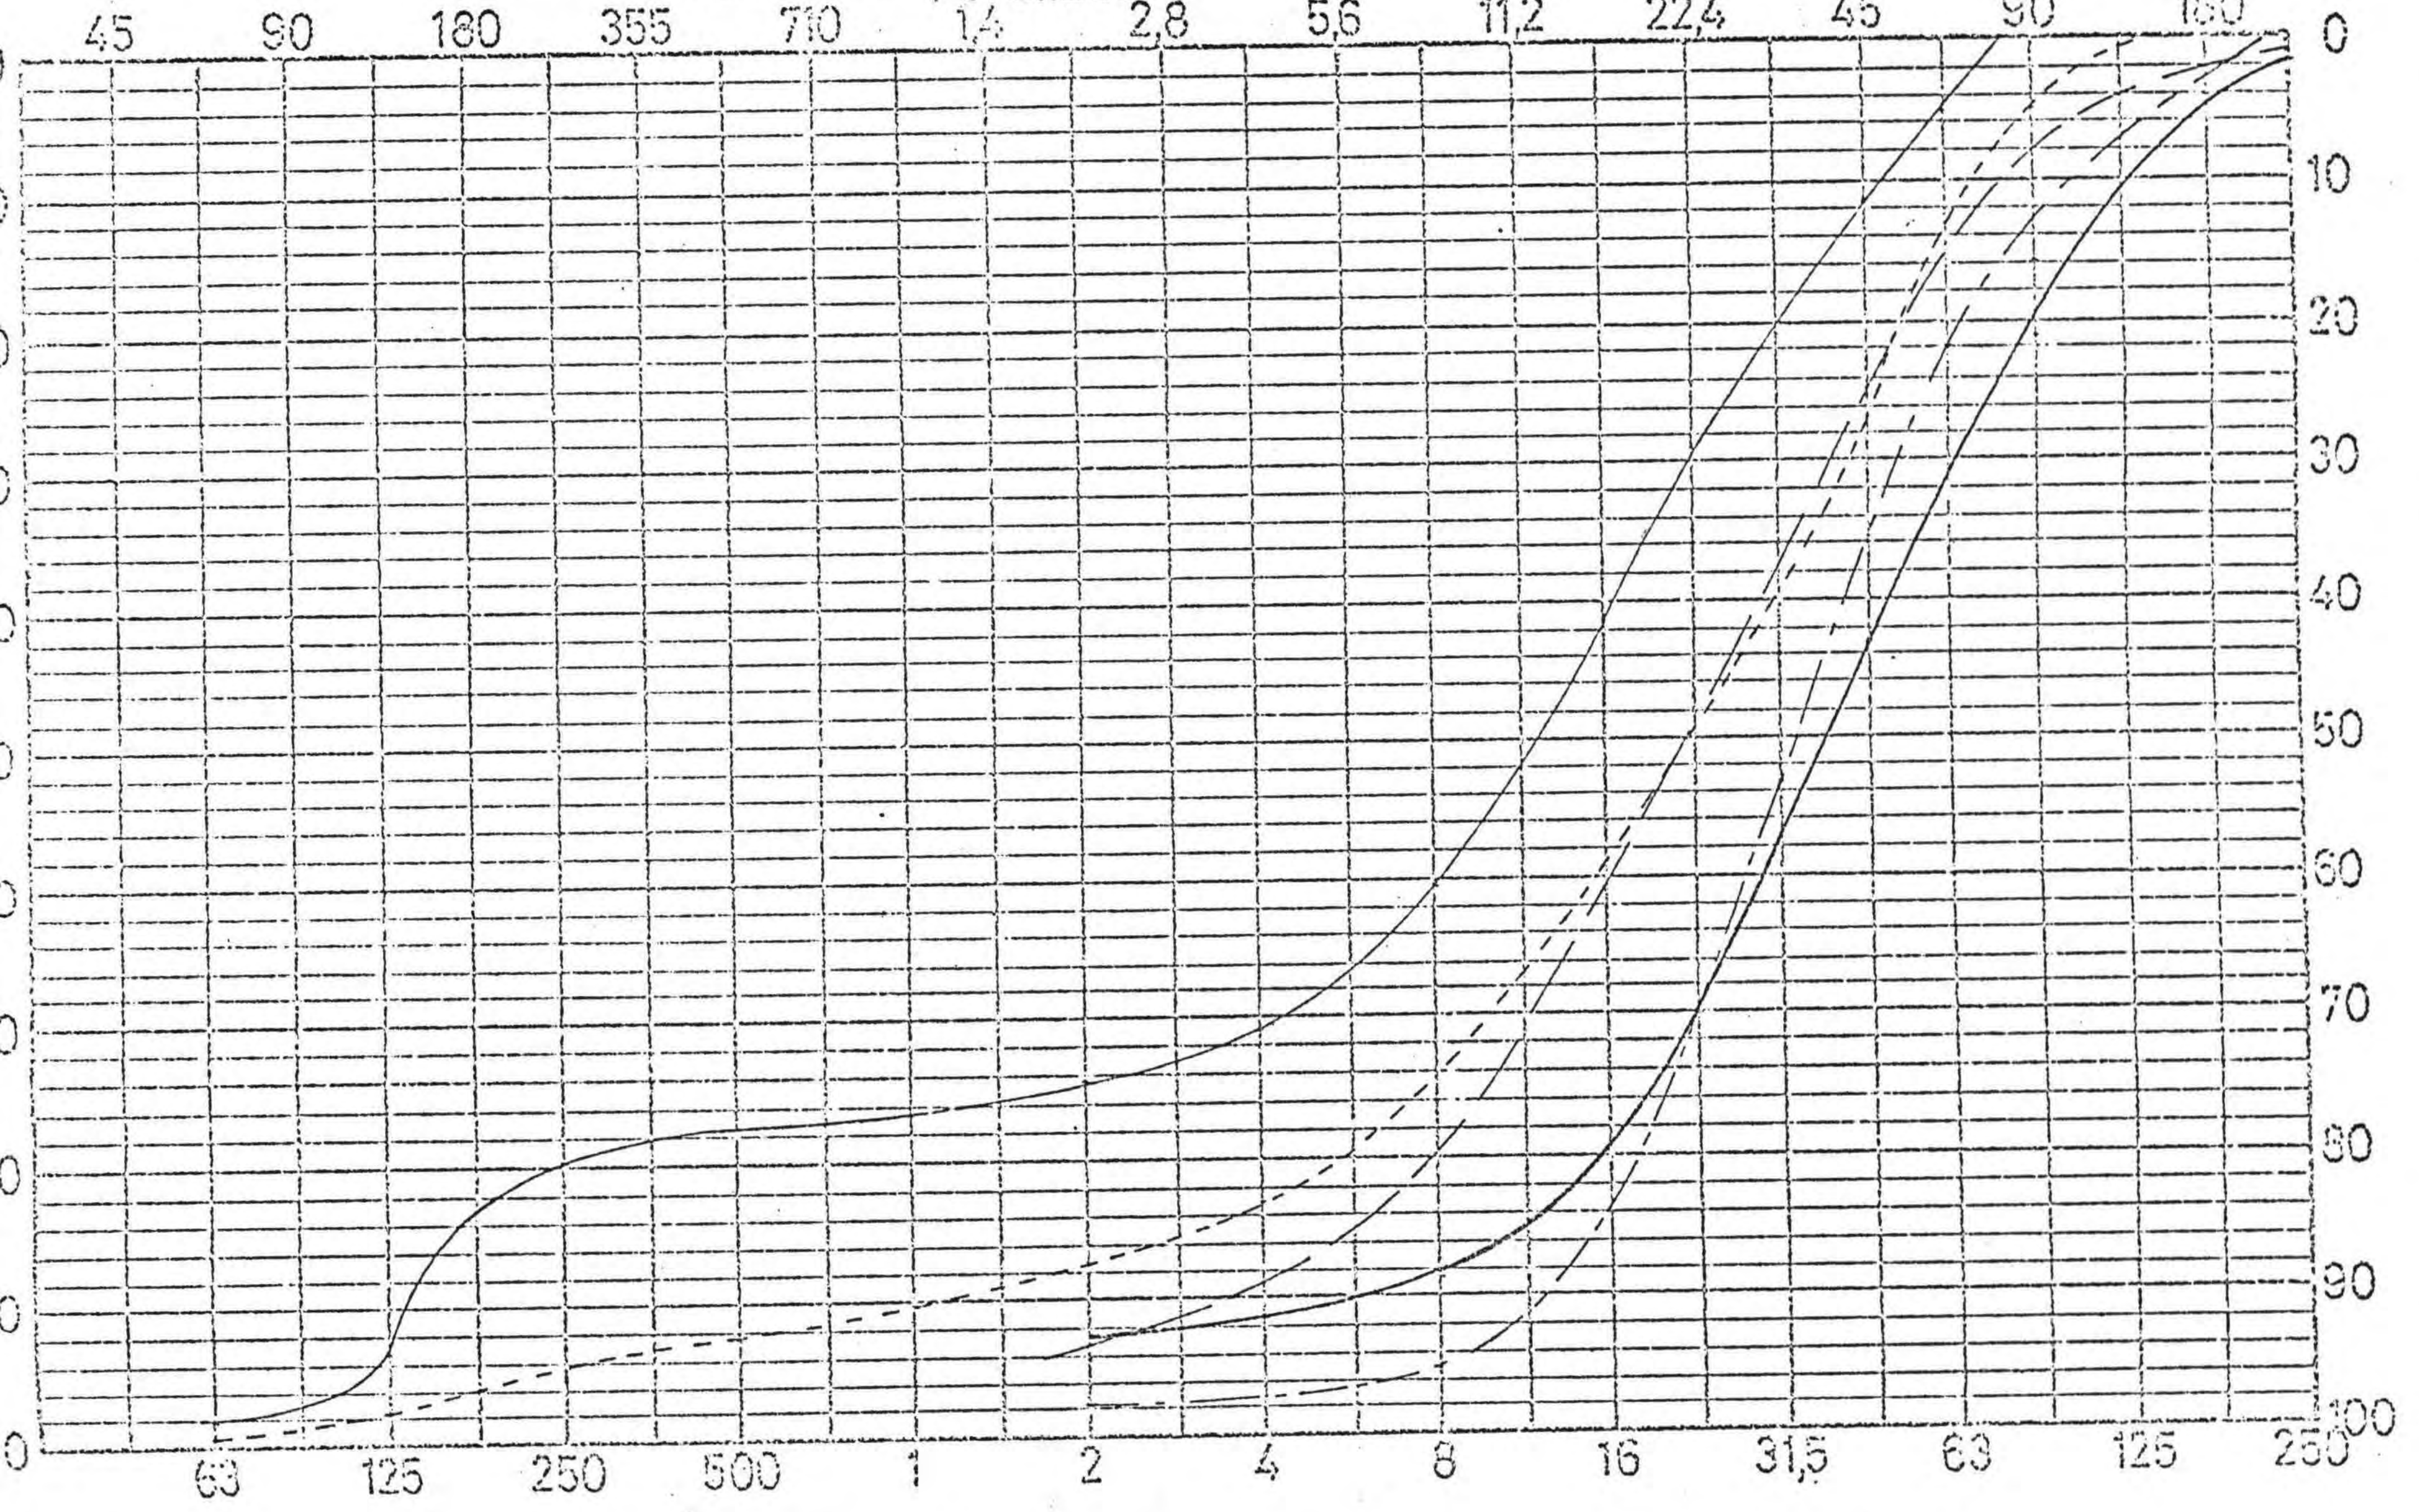

Zandfractie

