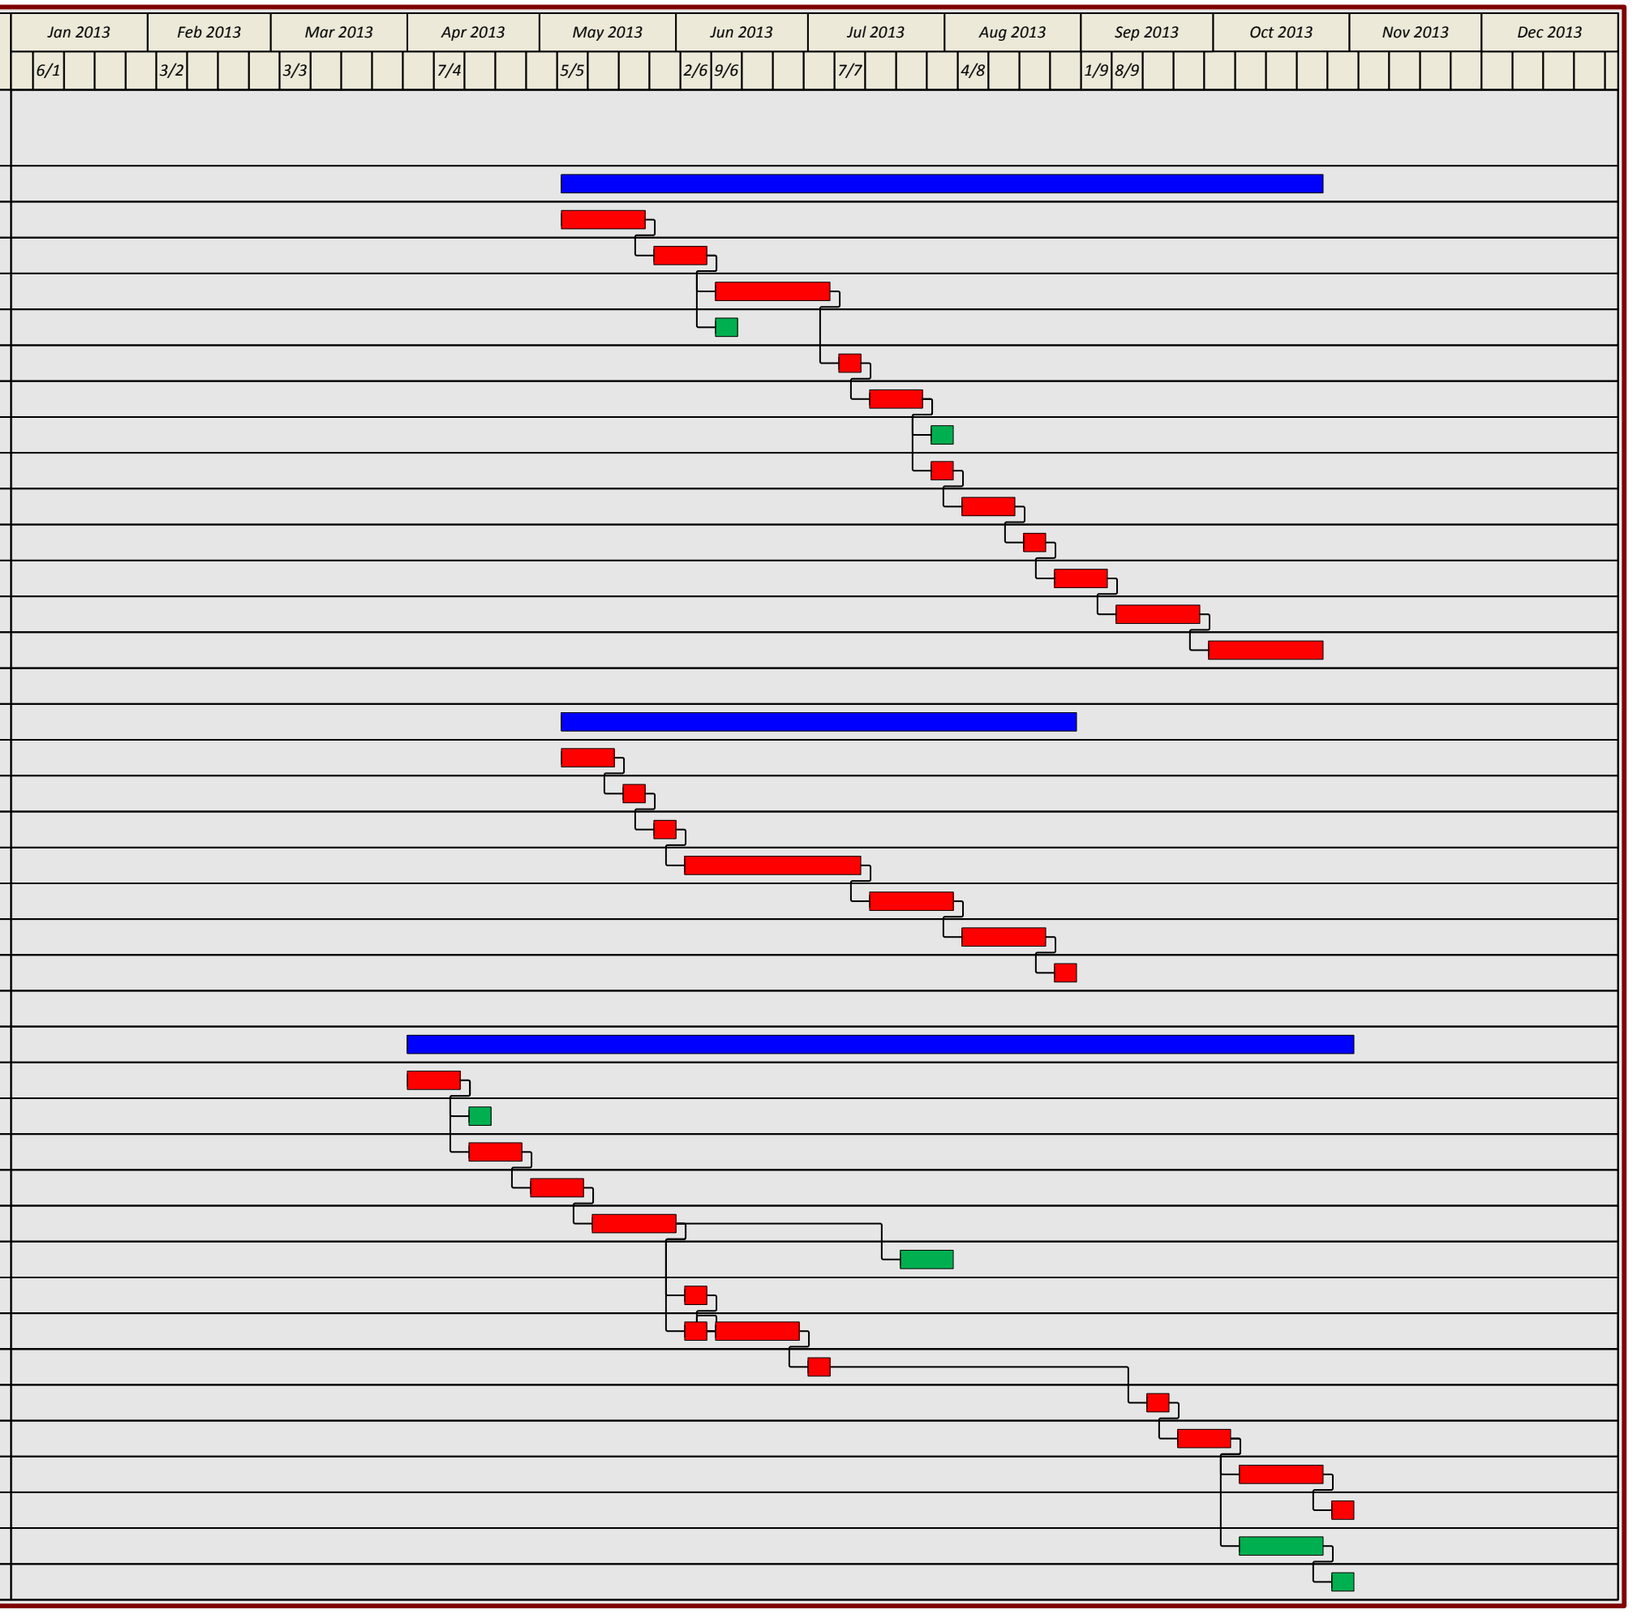ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1				
2	Kistdam	5/6/2013	10/25/2013	25w
3	Bouwrijpmaken grond	5/6/2013	5/24/2013	3w
4	Aanleg tijdelijk keerplaats vrachtauto's	5/27/2013	6/7/2013	2w
5	Steunberm aanleggen	6/10/2013	7/5/2013	4w
6	Aanleg tijdelijke weg	6/10/2013	6/14/2013	1w
7	Tijdelijke constructie heistelling	7/8/2013	7/12/2013	1w
8	Aanleg buitendijkse damwand	7/15/2013	7/26/2013	2w
9	Verplaatsen tijdelijke weg	7/29/2013	8/2/2013	1w
10	Tijdelijke constructie heistelling	7/29/2013	8/2/2013	1w
11	Aanleg binnendijkse damwand	8/5/2013	8/16/2013	2w
12	Verwijderen tijdelijke weg en aanleg tijdelijke toegang voor bewoners	8/19/2013	8/23/2013	1w
13	Volstorten kistdam	8/26/2013	9/6/2013	2w
14	Verwijderen tijdelijke constructies	9/9/2013	9/27/2013	3w
15	Aanleg weg met fietspad en wegmeubilair	9/30/2013	10/25/2013	4w
16				
17	Damwand	5/6/2013	8/30/2013	17w
18	Aanleg tijdelijke keerplaats vrachtauto's	5/6/2013	5/17/2013	2w
19	Tijdelijke constructie heistelling	5/20/2013	5/24/2013	1w
20	Aanleg tijdelijke weg	5/27/2013	5/31/2013	1w
22	Aanleg damwand	6/3/2013	7/12/2013	6w
21	Aanleg weg en fietspad	7/15/2013	8/2/2013	3w
23	Verwijderen tijdelijke constructies	8/5/2013	8/23/2013	3w
24	Aanleg wegmeubilair en afwerking	8/26/2013	8/30/2013	1w
25				
26	Opvijzelen	4/1/2013	11/1/2013	31w
28	Opvijzelen woningen	4/1/2013	4/12/2013	2w
27	Aanleg tijdelijke toegang woningen	4/15/2013	4/19/2013	1w
30	Bouwrijpmaken grond	4/15/2013	4/26/2013	2w
29	Aanleg tijdelijke keerplaats vrachtauto's	4/29/2013	5/10/2013	2w
31	Ophogen talud	5/13/2013	5/31/2013	3w
33	Ophogen talud	7/22/2013	8/2/2013	2w
35	Verwijderen dijkweg	6/3/2013	6/7/2013	1w
34	Ophogen dijk	6/10/2013	6/28/2013	3w
37	Aanleg tijdelijke weg	7/1/2013	7/5/2013	1w
38	Verwijderen tijdelijke weg	9/16/2013	9/20/2013	1w
39	Ophogen dijk	9/23/2013	10/4/2013	2w
40	Aanleg weg en fietspad	10/7/2013	10/25/2013	3w
41	Wegmeubilair	10/28/2013	11/1/2013	1w
42	Verwijderen tijdelijke constructies	10/7/2013	10/25/2013	3w
43	Tuinen bewoners	10/28/2013	11/1/2013	1w
